
Réunion publique d'Information Lundi 25 Mars 2019 – 18h30 Salle de quartier du Moulin d'Eau



TRAVAUX
RUE DU MOULIN D'EAU
RUE PLANCHEPALEUIL




Quelques rappels

- Un projet lancé depuis environ 1 an, qui a donné lieu à un état des lieux très complet des ouvrages à reprendre et des travaux à réaliser en propriétés privées (env. 90% de propriétés visitées).
- Durée d'étude prolongée du fait des résultats des investigations complémentaires (présence d'amiante, contraintes de niveau, non-conformité du réseau HTA, ...).
- 2 réunions publiques (22/05 et 11/12/18) organisées pour présenter les travaux envisagés et prendre en compte les suggestions des riverains



Périmètre des travaux LOTZ - Rue Planchepaleuil Rue Moulin d'Éa

LOT1: Rue du Moulin d'Eau

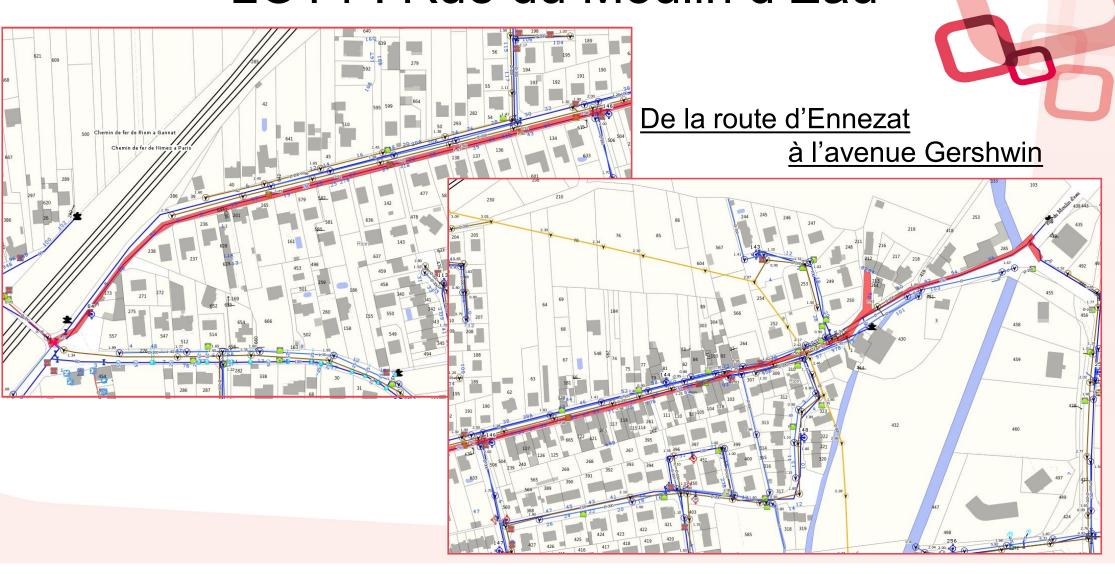

Des travaux sur les réseaux « humides »

- Eau potable : Remplacement des 2 conduites existantes par une conduite unique + renouvellement / mise en conformité des branchements particuliers (déplacement des compteurs en limite de propriété)
- Défense incendie : Déplacement des 3 poteaux d'incendie existants pour améliorer leur couverture
- Assainissement : Création d'un réseau de collecte entre av. Cités Unies et av. Gershwin, avec construction d'un poste de relevage impasse « Vallière » + mise en conformité des parties publiques des branchements + réparations du collecteur existant
- Eaux pluviales : Mise en conformité des parties publiques des branchements
 + réparations du collecteur existant





... Et de requalification de la voirie

- Objectif de ralentir la circulation rue du Moulin d'eau :
 - Rétrécissement de la largeur de chaussée à 5 mètres
 - Création d'une piste cyclable montante d'une largeur de 1m20, avec stationnement à cheval autorisé sur emplacements matérialisés
 - Modification des carrefours avec les rues Planchepaleuil et Algemesi, avec création de 2 « stop » rue Moulin d'Eau et priorités aux voies intersectées
- Création d'un cheminement piétonnier :
 - Mise en conformité des passages piétons (réalisation d'abaissés avec bandes podotactiles)
 - Réfection générale du trottoir côté numéros impairs entre route d'Ennezat et av. Cités Unies (sous réserve de remises d'offre en cohérence avec l'enveloppe prévisionnelle budgétée)



LOT2: Rue Planchepaleuil

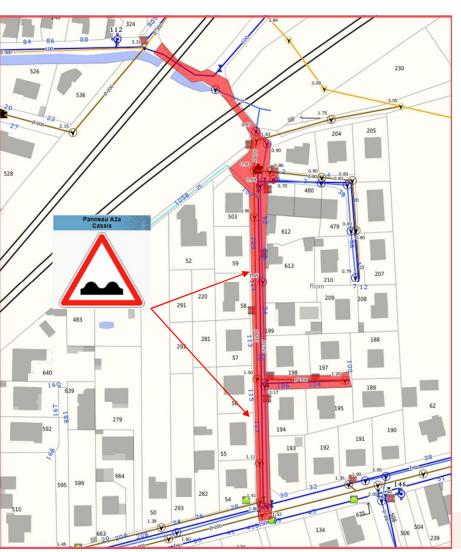



- Eaux pluviales : Mise en conformité des parties publiques des branchements + mise en séparatif dans l'impasse
- Voirie : Réfection générale de la chaussée avec création d'un caniveau longitudinal et 2 caniveaux transversaux pour réduire la vitesse (cassis)



Détails de l'opération

 Montant global d'opération 	1.340.000 € TTC
Dont Budget annexe Eau	468.000 € TTC
 Dont Budget annexe Assainissement 	417.000 € TTC
Dont Budget principal	455.000 € TTC
• Exécution des travaux à compter de déla	but mai 2019
LOT 1 « Rue Moulin d'Eau »	934.000 € TTC
 Groupement d'entreprises EUROVIA / SADE 	6 mois
LOT 2 « Rue Planchepaleuil »	358.000 € TTC
Entreprise EUROVIA	3 mois



Planning prévisionnel 2019

			Avril					Ma	i			Ju	ıin							
Opération	S14	S15	S16	S17	S18	S :	19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S2	9 5	S30	S 31
Relance autorisations propriétaires																				
Choix de l'entreprise retenue (CMAPA d'attribution)									Rac	cor	den	neni	ts F	NFI	2IC					
Réunion publique (18h30 - salle de quartier Moulin d'Eau)								Raccordements ENEDIS												
Notification marché de travaux								les 29 et 30/05												
Phase de préparation												П	П	П	П					
Réunion phase de préparation / concessionnaires																				
Validation plan de déviation + panneaux de communication																				
Courrier d'information																				
Raccordements ENEDIS																			\Box	
Travaux LOT1 : Rue du Moulin d'Eau																				
Travaux LOT2 : Rue Planchepaleuil																				
Réceptions travaux																				

	Juillet						Août							Septe		Octobre							Novembre				
Opération	S27	S28	S29	S	30	S31	S32	S	33	S34	S35	S3	6	S37	S38	S39	S40	S	41	S42	S43	S44	1	S45	S46	S47	S48
Relance autorisations propriétaires																											
Choix de l'entreprise retenue (CMAPA d'attribution)																											
Réunion publique (18h30 - salle de quartier Moulin d'Eau)																											
Notification marché de travaux																											
Phase de préparation												П															
Réunion phase de préparation / concessionnaires																											
Validation plan de déviation + panneaux de communication												П															
Courrier d'information																											
Raccordements ENEDIS												П															
Travaux LOT1 : Rue du Moulin d'Eau																											
Travaux LOT2 : Rue Planchepaleuil																											
Réceptions travaux																											1



Présentation des entreprises et de l'Organisation de chantier



PHASE 1A-a

Semaines 19 et 20 : 6 mai au 17 mai 2019



Conditions d'accès et de circulation :
Accès et circulation barrée depuis route d'Ennezat direction centre ville et depuis Centre ville/direction route d'Ennezat.

Les usagers provenants du centre ville sont déviés via la rue Grégoire de Tour, rue de la Varenne en direction de l'avenue du stade

Les usagers provenants de la route d'Ennezat sont dirigés vers la rue des Dagneaux en direction de l'avenue du Stade où ils peuvent reprendre la direction du centre ville.

Nous vous proposerons en phase de préparation de chantier de réaliser ces travaux de

Conditions d'accès et de circulation :

Travaux sous rue barrée.

Accès autorisé uniquement pour les riverains. Accès via la rue Planchepaleuil ou la rue du Moulin d'eau suivant avancement des réseaux.

La sortie chantier se fait par la rue du Moulin d'Eau (pose du réseau EU depuis le point bas vers le point haut



PHASE 1A-b

Semaines 21 à 24 : du 20 mai au 14 juin 2019



Equipe 1 SADE : Pose de la conduite AEP sous trottoir depuis giratoire Route d'Ennezat à Rue Planchepaleuil + amorce antenne Ø60 rue Planchepaleuil.

Conditions d'accès et de circulation :

Accès et circulation des riverains maintenus en partie basse de la rue. En fonction de l'emprise des travaux => possibilité de mettre en place un alternat par feux tricolores pour gestion de la circulation des riverains en partie haute.

Travaux réalisés : Equipe 1 EUROVIA : Réseau principaux EU/AEP + antenne impasses

Conditions d'accès et de circulation :

Travaux sous rue barrée.

Accès autorisé uniquement pour les riverains. Accès via la rue Planchepaleuil ou la rue du Moulin d'eau suivant avancement des réseaux.

La sortie chantier se fait par la rue du Moulin d'Eau (pose du réseau EU depuis le point bas vers le point haut



PHASE 1B

Semaines 25 et 26 : du 17 juin au 28 juin 2019



Conditions d'accès et de circulation :

Accès et circulation des riverains maintenus en partie basse de la rue.

Accès des riverains dans la zone des travaux => par l'amont ou l'aval de la zone en en fonction du positionnement et de l'avancement des branchements et ouvrages à reprendre

Conditions d'accès et de circulation : Travaux sous rue barrée.

Accès autorisé uniquement pour les riverains. Accès via la rue Planchepaleuil ou la rue du Moulin d'eau suivant avancement des branchements.

L'accès chantier se fait par la rue Planchepaleuil



PHASE 1C

Semaines 27 à 29 : du 1er juillet au 19 juillet 2019



Travaux réalisés : Equipe 1 SADE + Equipe 2 EUROVIA : Réfections parties privatives + réparations réseaux EU/EP

Equipe 2 Equipe 3 EUROVIA : Aménagements trottoirs

Conditions d'accès et de circulation :

Accès et circulation des riverains maintenus en partie basse de la rue. Accès des riverains dans la zone des travaux => par l'amont ou l'aval de la zone en en fonction du positionnement et de l'avancement des travaux.

Travaux réalisés : Equipe 4 EUROVIA : Décaissement/engravement de chaussée - Caniveaux - 0/31.5, revêtements, signalisation. Repli de chantier

Conditions d'accès et de circulation :

Travaux sous rue barrée.

Accès autorisé uniquement pour les riverains suivant avancement du décaissement/remblaiement

L'accès chantier se fait par la rue Planchepaleuil



PHASE 1D

Semaines 30 et 31 : du 22 juillet au 2 aout 2019



Conditions d'accès et de circulation :Accès et circulation des riverains maintenus en partie basse de la rue.

Accès des riverains dans la zone des travaux => par l'amont ou l'aval de la zone en en fonction du positionnement et de l'avancement des travaux.

Travaux réalisés : Travaux terminés

Conditions d'accès et de circulation : Rue réouverte.

Sortie sur rue du Moulin d'eau fermée. Sortie via rue planchepaleuil



PHASE 2A

Semaines 32 et 35*: 5 aout au 30 aout 2019 * coupures congés d'été 3 semaines



Travaux réalisés : Equipe 1 SADE : Réseau AEP de rue Planchepaleuil à rue des Citées Unies + début reprise

Equipe 1 EUROVIA : Terrassement et pose du poste

Conditions d'accès et de circulation :

Accès et circulation des riverains maintenus en partie haute de la rue. Accès des riverains dans la zone des travaux => par l'amont ou l'aval de la zone en en fonction du positionnement et de l'avancement des travaux.

Travaux réalisés : Travaux terminés

Conditions d'accès et de circulation : Rue réouverte.

Sortie sur rue du Moulin d'eau fermée le temps de passer les réseaux dans l'emprise du carrefour. Sortie via rue planchepaleuil



PHASE 2B

Semaines 36 à 38 : 2 septembre 20 septembre 2019



Conditions d'accès et de circulation :

Accès et circulation des riverains maintenus en partie haute de la rue.

Accès des riverains dans la zone des travaux ⇒ par l'amont ou l'aval de la zone en en fonction

du positionnement et de l'avancement des branchements et ouvrages à reprendre

Travaux réalisés : Travaux terminés

Conditions d'accès et de circulation : Rue réouverte.



PHASES 2C - 3A

Semaines 39 et 40 : 23 septembre au 4 octobre 2019



Conditions d'accès et de circulation :
Accès et circulation des riverains maintenus en partie haute de la rue.
Accès des riverains dans la zone des travaux => par l'amont ou l'aval de la zone en en fonction du positionnement et de l'avancement des branchements et ouvrages à reprendre

Conditions d'accès et de circulation : Rue réouverte.



PHASES 2D - 3B


Semaines 41 et 42 : 7 octobre au 18 octobre 2019!019



PHASES 3D

Semaine 43: 21 octobre au 25 octobre 2019



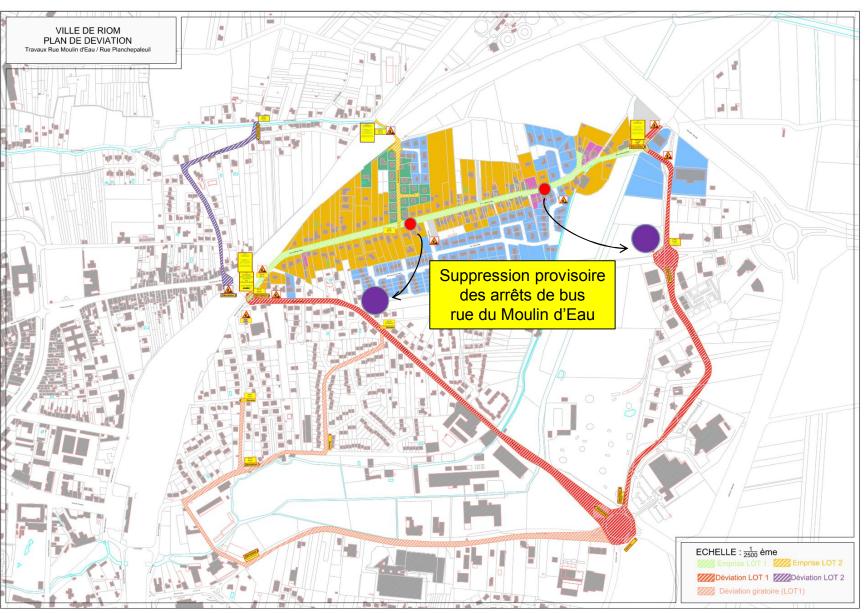





Impact sur les transports en commun





+ d'infos sur ; www.rlv.eu

Point Information RLV Mobilités,

Gare SNCF de Riom - Tél: 04 73 38 08 09

RIOM LIMAGNE

& VOLCANS




Impact sur la collecte des déchets









Merci de votre attention

