


Travaux entreprise

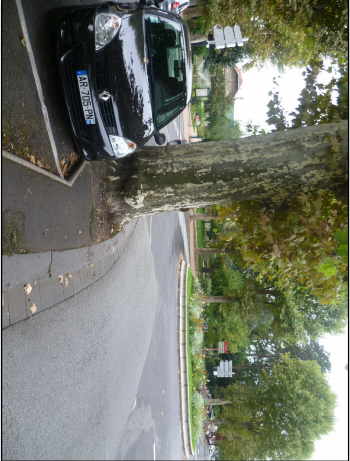

- 1**
- TRAVAUX**
- création d'un bateau
 - pose d'une borne pour interdire le stationnement côté BD
 - marquage au sol passage piéton
 - déplacement du panneau cédez le passage côté placette

- PROBLEMES**
- visibilité moyenne des piétons (courbe et arbre côté gare)
 - suppression d'une place
 - tourne à gauche réduit par passage piéton

2

- TRAVAUX**
- dépose J11 et 2 bornes granit
 - suppression du bateau des 2 côtés
 - mise aux normes de la place PMR

3

- TRAVAUX**
- suppression du passage piéton en pavés
 - déplacement du totem
 - dépose des bornes granit
 - pose de bornes côté Bd
 - élargissement bateau
 - marquage au sol passage piéton cycle



4

- TRAVAUX**
- dépose des bornes granit et reprise des pavés
 - déplacement des 2 bancs et de la corbeille

- PROBLEME**
- panneau DECAUX plus protégé par les bornes



5

- TRAVAUX**
- reprise des bateaux
 - marquage au sol cycle
 - dépose et repose des bornes côté Bd et rue du Marthuret
- PROBLEMES**
- Attention si arrêt minute supprimé , prévenir commerçants



Travaux en régie
